


Comisión Nacional de Operación - CNO

Localización del proyecto



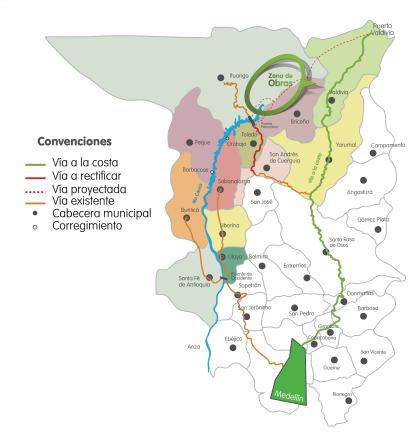


Área de influencia: 12 municipios (Ituango, Peque, Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Olaya, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Puerto Valdivia y Yarumal).

Población área de influencia: 170.000 habitantes aprox.




Descripción del proyecto

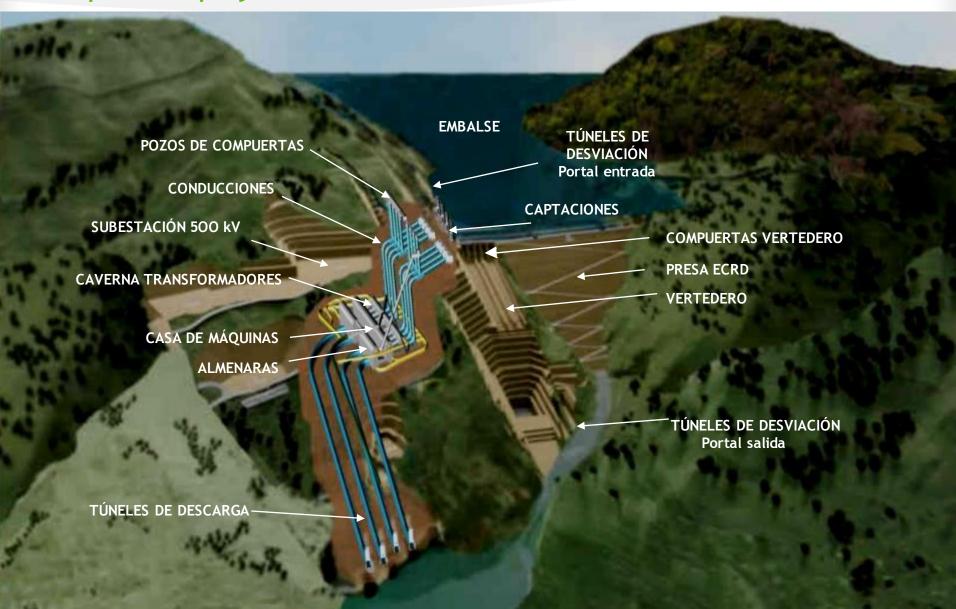

က္[®]

Características del proyecto

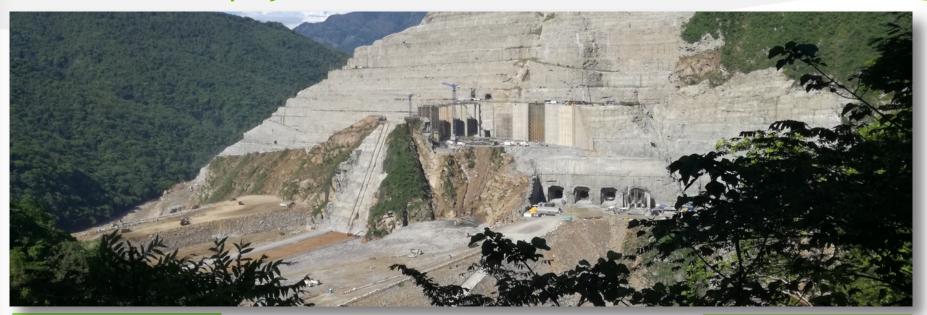

PRESA

•Tipo: Lleno de roca con núcleo

•Volumen: 20 millones m³

•Altura:225 m

•Longitud corona: 548 m

CAPTACIONES

•Cantidad: 8

Compuertas: Deslizante, presiones equilibradas
Dimensiones: 4,7 x 6,6 m

VERTEDERO

•Tipo: canal abierto

•Compuertas: 4 radiales

•Excavación: 14 millones m³

•Longitud: 405 m

•Ancho canal: variable 95 a 70 m

CONDUCCIONES

•Cantidad: 8

•Longitud total: 340 m

•Conducción superior: 118 m

•Pozos de presión: 153 m

•Conducción inferior: 69 m

EMBALSE

•Longitud: 79 km

•Volumen nivel máximo de operación: 2.720 millones m³

•Volumen útil: 975 millones m³

•Área: 3.800 Ha

OBRAS DE DESCARGA

•Almenaras: 2

•Dimensiones: 100 (l), 18 (a)

•Túneles de descarga: 4

•Longitud túneles: entre 906 m

v 1157 m

•Diámetro túneles: 12,5 m

HIDROLOGÍA

•Caudal medio: 1.010 m³/seg

•Caudal ecológico: 450 m³/seg

CAVERNAS

•Casa de máquinas dimensiones (m): 240 (l) 23(a) 49(h)

•Transformadores dimensiones (m): 200 (l 1er piso), 217 (l 2do piso), 16 (a), 19 (h)

က္[®]

Características del proyecto



TURBINAS

- •Cantidad:8
- •Tipo: Francis de eje vertical
- •Potencia nominal: 307 MW
- •Velocidad sincrónica: 180 r/min
- •Salto neto de diseño: 197,3 m
- •Caudal de diseño: 168.3 m³/s unidad.

TRANSFORMADORES

- •Cantidad: 24 + 1 repuesto
- •Tipo: Monofásicos
- •Voltaje de entrada:18 kV
- •Voltaje de salida: 500 kV
- •Potencia:112 MVA

GENERADORES

- •Cantidad: 8
- •Tipo: Sincrónico de eje vertical
- •Capacidad nominal: 337 MVA
- •Factor de potencia: 0,90 en atraso
- •Voltaje nominal:18 kV
- Velocidad sincrónica: 180r/min

PUENTE GRÚAS

- •Cantidad: 2
- •Capacidad: 300 toneladas
- •Luz: 19,5 m

SUBESTACIÓN PRINCIPAL DEL STN


- •Tipo: Superficial, encapsulada aislada en SF6
- •Voltaje: 500 kV
- •Circuitos de generación: 8
- •Circuitos de líneas:5

Avance general del proyecto a mayo 31 de 2017



- 69,9 % avance físico general
- \$11,4 billones costo total
- \$6,43 billones invertidos
- \$1,46 billones, presupuesto 2017
- **\$0,57** billones ejecutado 2017
- 10.000 empleos Directos, 26.000 Indirectos

Energía Firme Ituango




Localización general de las obras






Costo y cronograma a mayo 31 de 2017

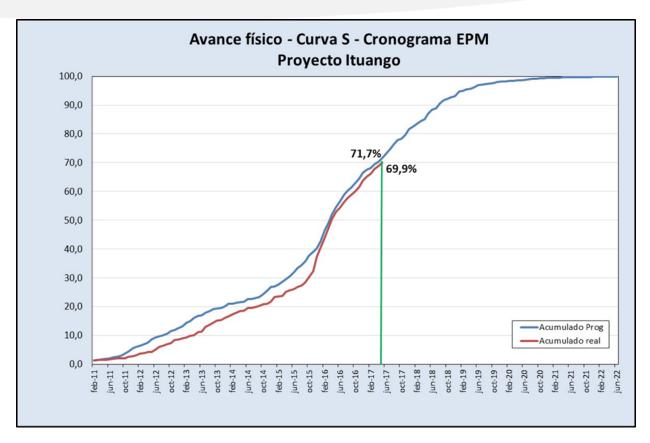


Presupuesto 2017 (COP \$ M corrientes)					
Total año			1.460.000		
Ejecutado a mayo			566.671		

Avance financiero (COP \$ M corrientes)				
	Costo Total Avance		% Avance	
Costo Total actual	11.360.919	6.428.333	56,6%	

Principales hitos

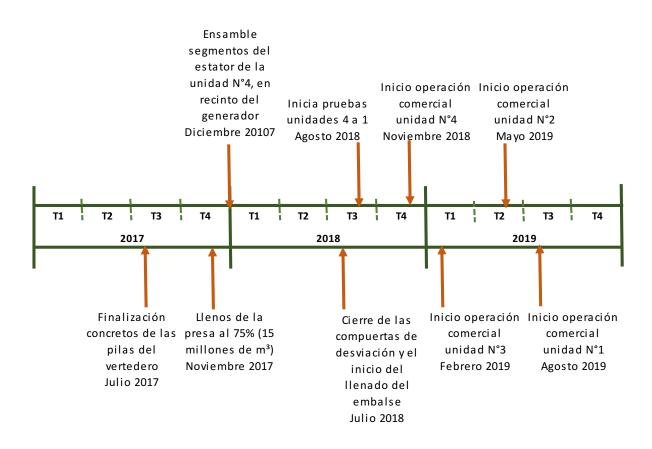

Llenos de la presa

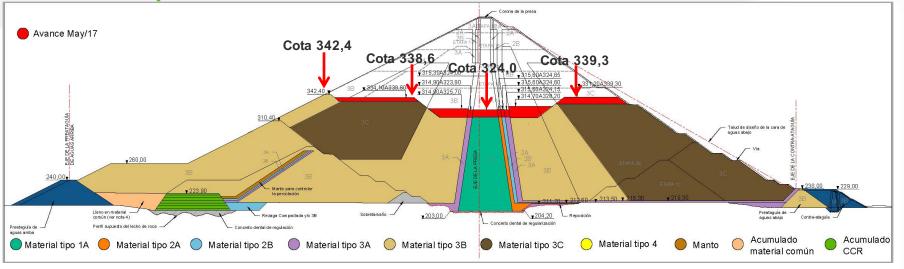


Esquema general de avance en los llenos de la presa



Etapa 9 - Colocación de material en la presa

Vertedero - Excavaciones y concretos

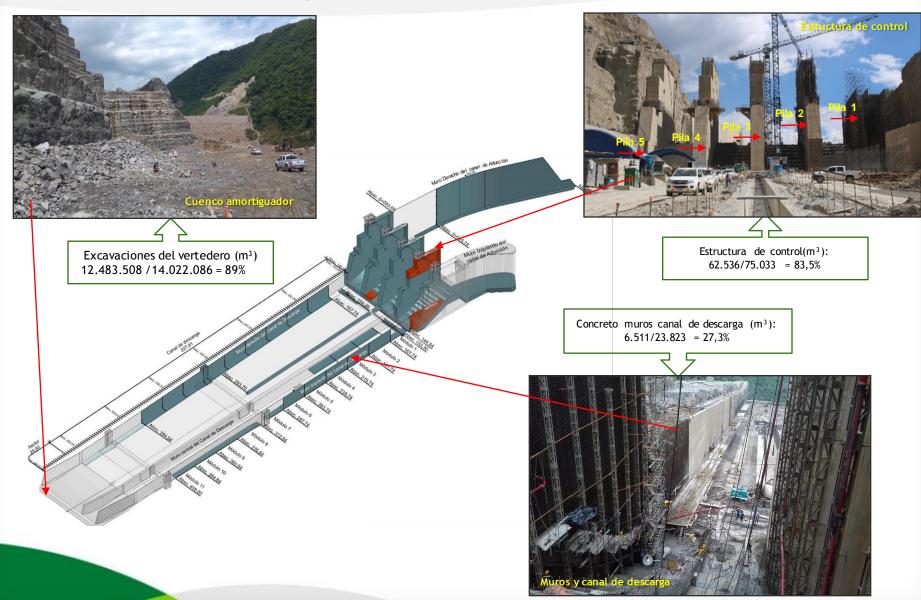

Túneles de conducción



Exc. Plazoleta captación (m³): 598.000 - 100% Estructuras captación (m³): 1.690/12.399 - 13,6% Captación

Captación

Pozos de compuertas

Pozos de presión

Túneles de conducción superiores

Túneles de conducción inferiores

Exc. conducción inferiores: 550 m - 100% Concreto codos 1 a 4: 8.424 m³ - 100% Blindaje túneles inferiores 1 a 4: 95%





Plazoleta compuertas (m³): 647.000 m³ - 100% Exc. pozos de compuertas (m): 680 - 100% Revestimiento pozos de compuertas (m): 27/680 - 4%


Exc. Pozos de presión (m): 989/1.003 - 98,6% Revestimiento pozos presión (m): 310/824 - 38%




Exc. conducciones superiores (m): 936 - 100% Concretos invert cond. sup.(m): 374/851 - 44% Concretos bóveda cond. Sup. (m) 100/851 - 12%



Central Subterránea

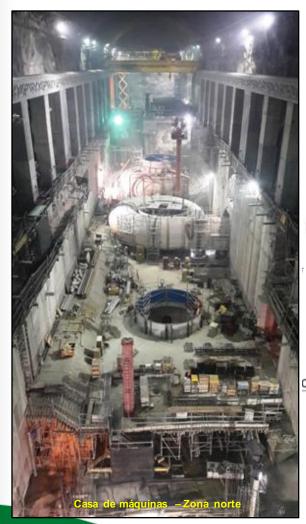

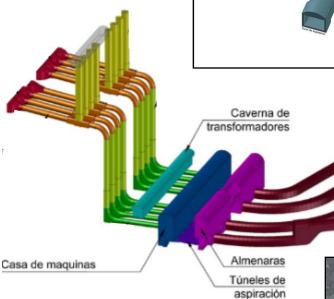

Concretos Casa de máquinas

Crema de Casa de Máquinas

Crema de Casa de Máquinas

Avance de concreto semanal

Concretos zona norte (m³): 16.475/26.521 - 62% Concretos zona sur muros (m³): 1.178/6.158 - 29% Concretos unidades 4, 3 y 2 (1.423 m³ c/u): 100%

Concretos cavema transformadores (m 3): 3.287/3.310 - 99% Concretos almenara I (m 3): 2.520/2.607 - 97%



Túneles de descarga de la central



SOLERA

aug Jug

HUND IND


Túnel de aspiración 2 - Concretos

Túneles de descarga de la central Excavaciones 4 túneles (m): 3.125/3.149 - 99% Concretos 4 estructuras salida (m³): 5.354 - 100% Concretos soleras túneles 1 y 4 (m): 1.893/3.595 - 52% Concretos túneles de aspiración unidades 4 a 1 (m³): 2.726/4.785 - 57%



Revestimiento descarga 4

Sistema Auxiliar de Desviación

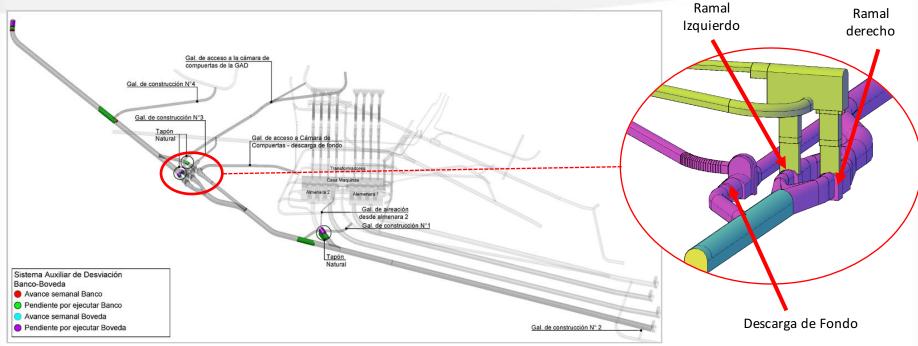



Concretos

Cámara de compuertas descarga de fondo(m³):4.060/4.298 - 94,5%

Cámaras de compuertas de la galería auxiliar (m³): 4.927/6.403 - 77%



Excavaciones Galería Auxiliar de Desviación Bóveda (m): 2.129/2.139 - 99,5% Banco (m): 1.989/2.145 - 93%

Equipos electromecánicos - Turbinas y generadores

Turbinas: Montaje de elementos embebidos



Unidad 4 - Montaje de elementos embebidos en concreto: Avance 99%



Unidad 3 - Montaje de elementos embebidos en concreto: Avance 72%



Unidad 2 - Montaje de elementos embebidos en concreto: Avance 32%

Fabricación turbinas y generadores (8)				
Avance fabricación	59%			
Unidades 1 a 4	Terminados			
Unidades 5 a 8	En proceso de fabricación			
Próximas entregas	Unidades 5 y 6, julio, octubre, diciembre 2017			

Equipos electromecánicos - Transformadores

Fabricación de transformadores Etapa I (13): 100% Etapa II (12): 34%




Fabricación de transformadores etapa II Montaje final en fábrica transformador 14

Montaje de transformadores Etapa I (13): 100%



Montaje de transformadores etapa I Compartimentos 4 y 3 del módulo GIB instalados

Equipos electromecánicos - Puentes grúa

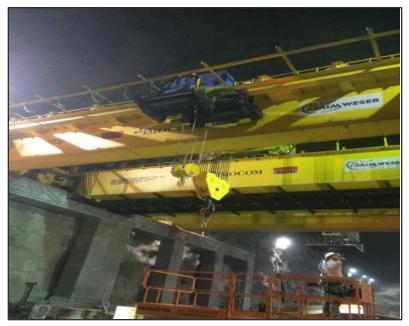

Puente grúa N°2 Casa de máquinas - Montaje




SAD - Montaje del puente grúa

MONTAJE PUENTE GRÚAS				
Puente grúa I - Casa de máquinas	En operación			
Puente grúa II - Casa de máquinas	En montaje - 90%			
Puente grúa GAD	En montaje - 80%			

Líneas de transmisión 500 kV

		Trámites pendientes			Fecha esperada de		
	Línea	CORAN- TIOQUIA	CAS	MADS (Subdirección Bosques)	respuesta de la ANLA (Otorgamiento licencia ambiental)	Tiempo estimado de construcción	
A	Antioquia - Medellín - Ancón Sur	OK	N.A.	ok	Licencia obtenida el 25 de abril de 2017 Resolución 00441 del 24 de abril de 2017	16 meses a partir de la obtención de licencia ambiental Fecha estimada de energización, 30 agosto 2018	
	Antioquia - Cerromatoso	1 levantamiento veda regional	N.A.	ok	9 de junio 2017 (Concepto Jurídico)	16 meses a partir de la obtención de licencia ambiental	
	Porce - Sogamoso	1 levantamiento veda regional	1 Levantamiento de veda, 2 sustracciones de áreas de reserva		30 de junio 2017	16 meses a partir de la obtención de licencia ambiental	
	Antioquia - Porce	1 levantamiento veda regional. Se van a volver a radicar los estudios a la Corporación	N.A		6 de junio se radican los estudios	16 meses a partir de la obtención de licencia ambiental	

Vía Puerto Valdivia - Presa

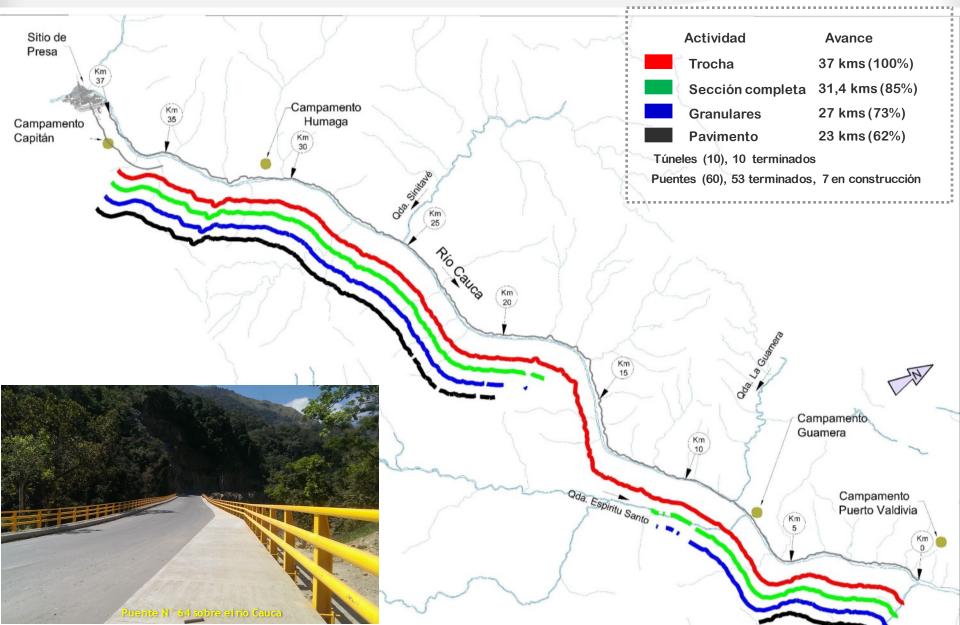

PMA: El proyecto como factor de integración del territorio



PMA: El sistema de integración del PHI en el territorio

Sistema Territorial

Conjunto de reglas utilizadas por los actores con el propósito de definir sus interacciones

Estructura Institucional

- •Sistema de regulación
- •Base material
 - Sistema de protección

Estructura Territorial

- Integración
 Dinámica territorial
 Biodiversidad/proces os ambientales
- Atributos antrópicos y biofísicos sobre los que se desarrollan las interacciones

Escenarios territoriales

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO: ESCENARIOS TERRITORIALES						
DINÁMICA	А	TERRITORIOS HIPER SUBSIDIADOS	TERRITORIOS SOSTENIBLES	TERRITORIOS SOSTENIBLES A		
	В	TERRITORIOS REZAGADOS	TERRITORIOS PRECOLOMBINOS		INTEGRACIÓN	
		В	A			
	BIODIVERSIDAD Y PROCESOS AMBIENTALES					

Escenarios institucionales

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO: ESCENARIOS INSTITUCIONALES SISTEMA DE REGULACIÓN LAS REGLAS DE JUEGO DEL INESTABILIDAD SOCIOPOLÍTICA Α **BASE MATERIAL ESTADO DE DERECHO** INSTITUCIONALIDAD PRECARIA LA LEY DEL MÁS FUERTE В В **E INSOSTENIBLE** В SISTEMA DE PROTECCIÓN

m°

Plan de Manejo Ambiental











Inversión social para el desarrollo

- 1 Plan de Manejo Ambiental:
 - Programado: \$765.227 millones
 - Ejecutado: \$458.995 millones
- 2 Programa Aldeas 800 viviendas, \$32.000 millones
- Gas EPM 5.489 familias, \$20.500 millones
- 4 Antioquia Iluminada 9.937 familias, \$37.000 millones
- Construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías: \$1,4 billones
 Caminos de herradura, 1 008 km

Vías secundarias, 162 km
Vías terciarias, 235 km
Vía a Puerto Valdivia, 38 km
Vías sustitutivas, 24 km

6 Empleos Directos, 10.000 – Indirectos, 26.000

Plan de Manejo Ambiental - RICV

Universos Poblacionales	Cant.	Total Concertaciones a may /17	Pendientes concertar	% de avance
Familias Orobajo	32	32	0	100%
Familias Barbacoas	36	36	0	100%
Familias Dispersas	37	36	1	97%
Familias Valdivia	96	95	1	99%
Familias S. Andrés de Cuerquia	61	61	0	100%
SUB Total familias RICV	262	260	2	99%
Mineros (personas)	1,408	1,048	360	74%
Compradores de oro	13	9	4	69%
Arrieros	35	0	35	0%
Volqueteros	10	10	0	100%
Paleros	20	20	0	100%
Transportadores Fluviales	11	0	11	0%
SUB Total personas, indemnizaciones y compensaciones	1,497	1,087	410	73%

Gracias Grupo-epm®



Sistema Auxiliar de Desviación - Creciente del río Cauca





