


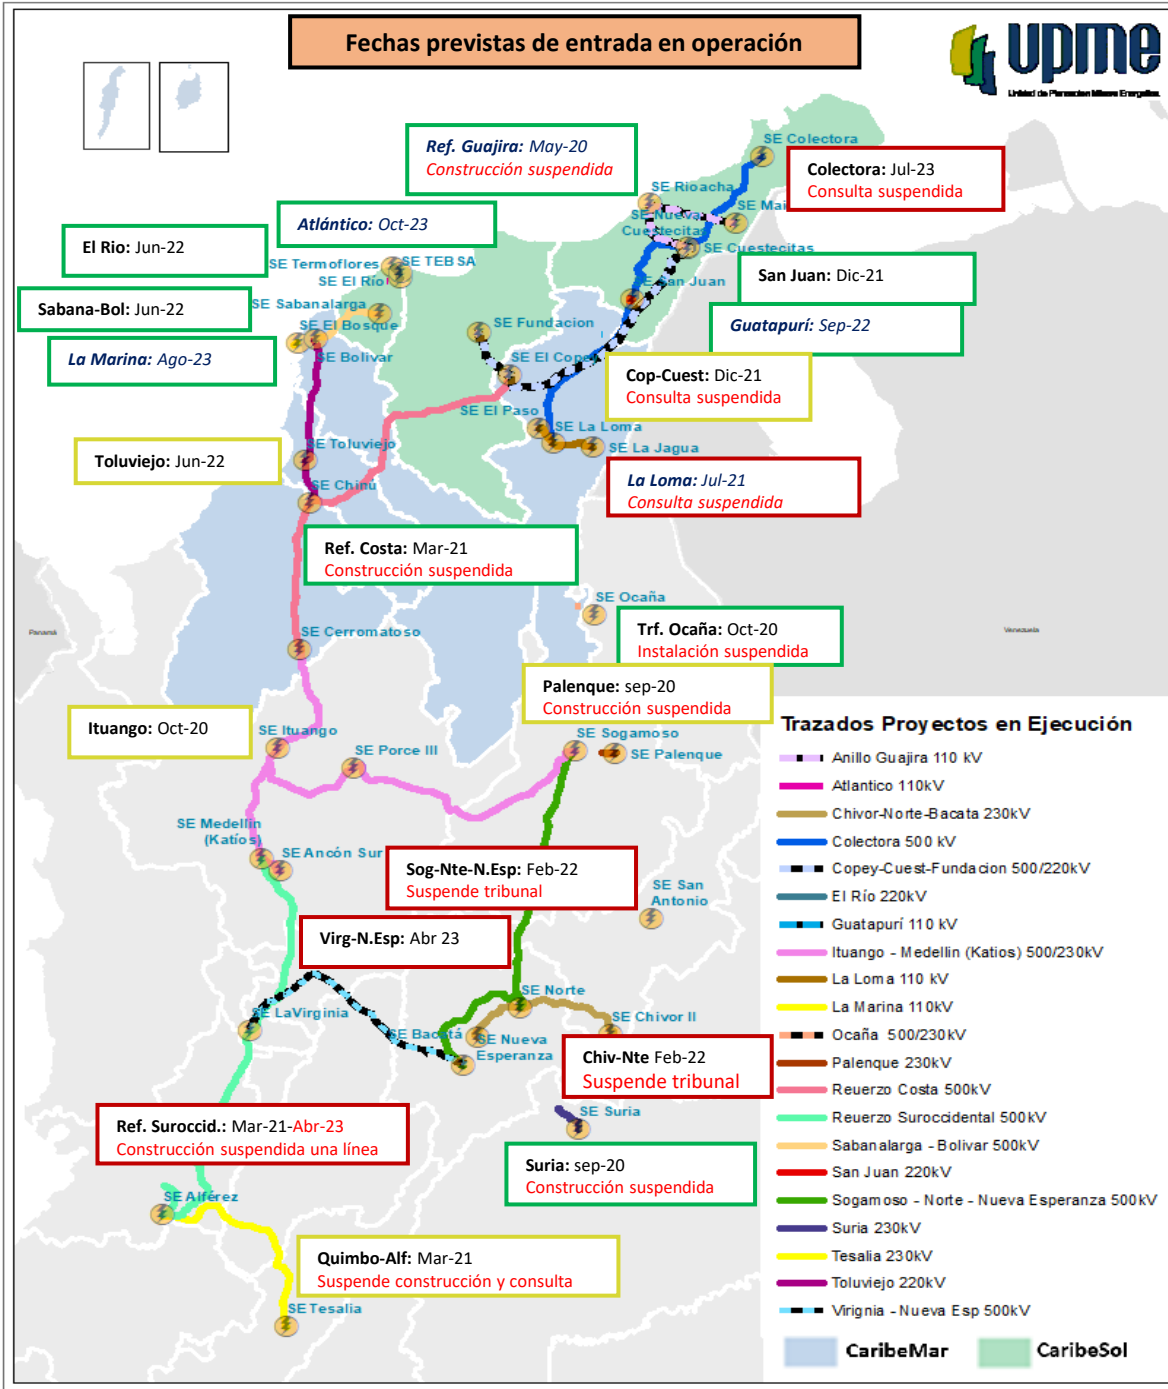

INFORME AVANCE 02/mar/2020

Se adjudicaron **La Loma - Sogamoso** y **Sahagún**. Permitirán conectar proyectos de las dos subastas.

La adjudicación de **Bonda - Río Córdoba** debió ser aplazada.

Sigue pendiente el pronunciamiento de la Magistrada Nelly Villamizar a efectos de resolver las licencias ambientales de Norte 500 kV, 230 kV y 115 kV.

Suspendida la consulta previa de los proyectos Colectora - Cuestecitas, Cuestecitas - La Loma, Copey - Cuestecitas y Quimbo - Alférez.

Suspendida la construcción de Refuerzo Costa, Suria, Palenque y Anillo Guajira.

Las fechas previstas del mapa son la foto antes de iniciar la emergencia sanitaria, las cuales se pueden afectar.

Fechas previstas de entrada en operación

Ref. Guajira: May-20
Construcción suspendida

Colectora: Jul-23
Consulta suspendida

Atlántico: Oct-23

El Río: Jun-22

Sabana-Bol: Jun-22

La Marina: Ago-23

San Juan: Dic-21

Guatapurí: Sep-22

Cop-Cuest: Dic-21
Consulta suspendida

Toluviejo: Jun-22

La Loma: Jul-21
Consulta suspendida

Ref. Costa: Mar-21
Construcción suspendida

Trf. Ocaña: Oct-20
Instalación suspendida

Palenque: sep-20
Construcción suspendida

Ituango: Oct-20

Trazados Proyectos en Ejecución

- Anillo Guajira 110 kV
- Atlántico 110kV
- Chivor-Norte-Bacata 230kV
- Colectora 500 kV

