


INFORME AVANCE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN

CONVOCATORIAS PÚBLICAS

5 de diciembre de 2017

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME

Balance de las convocatorias

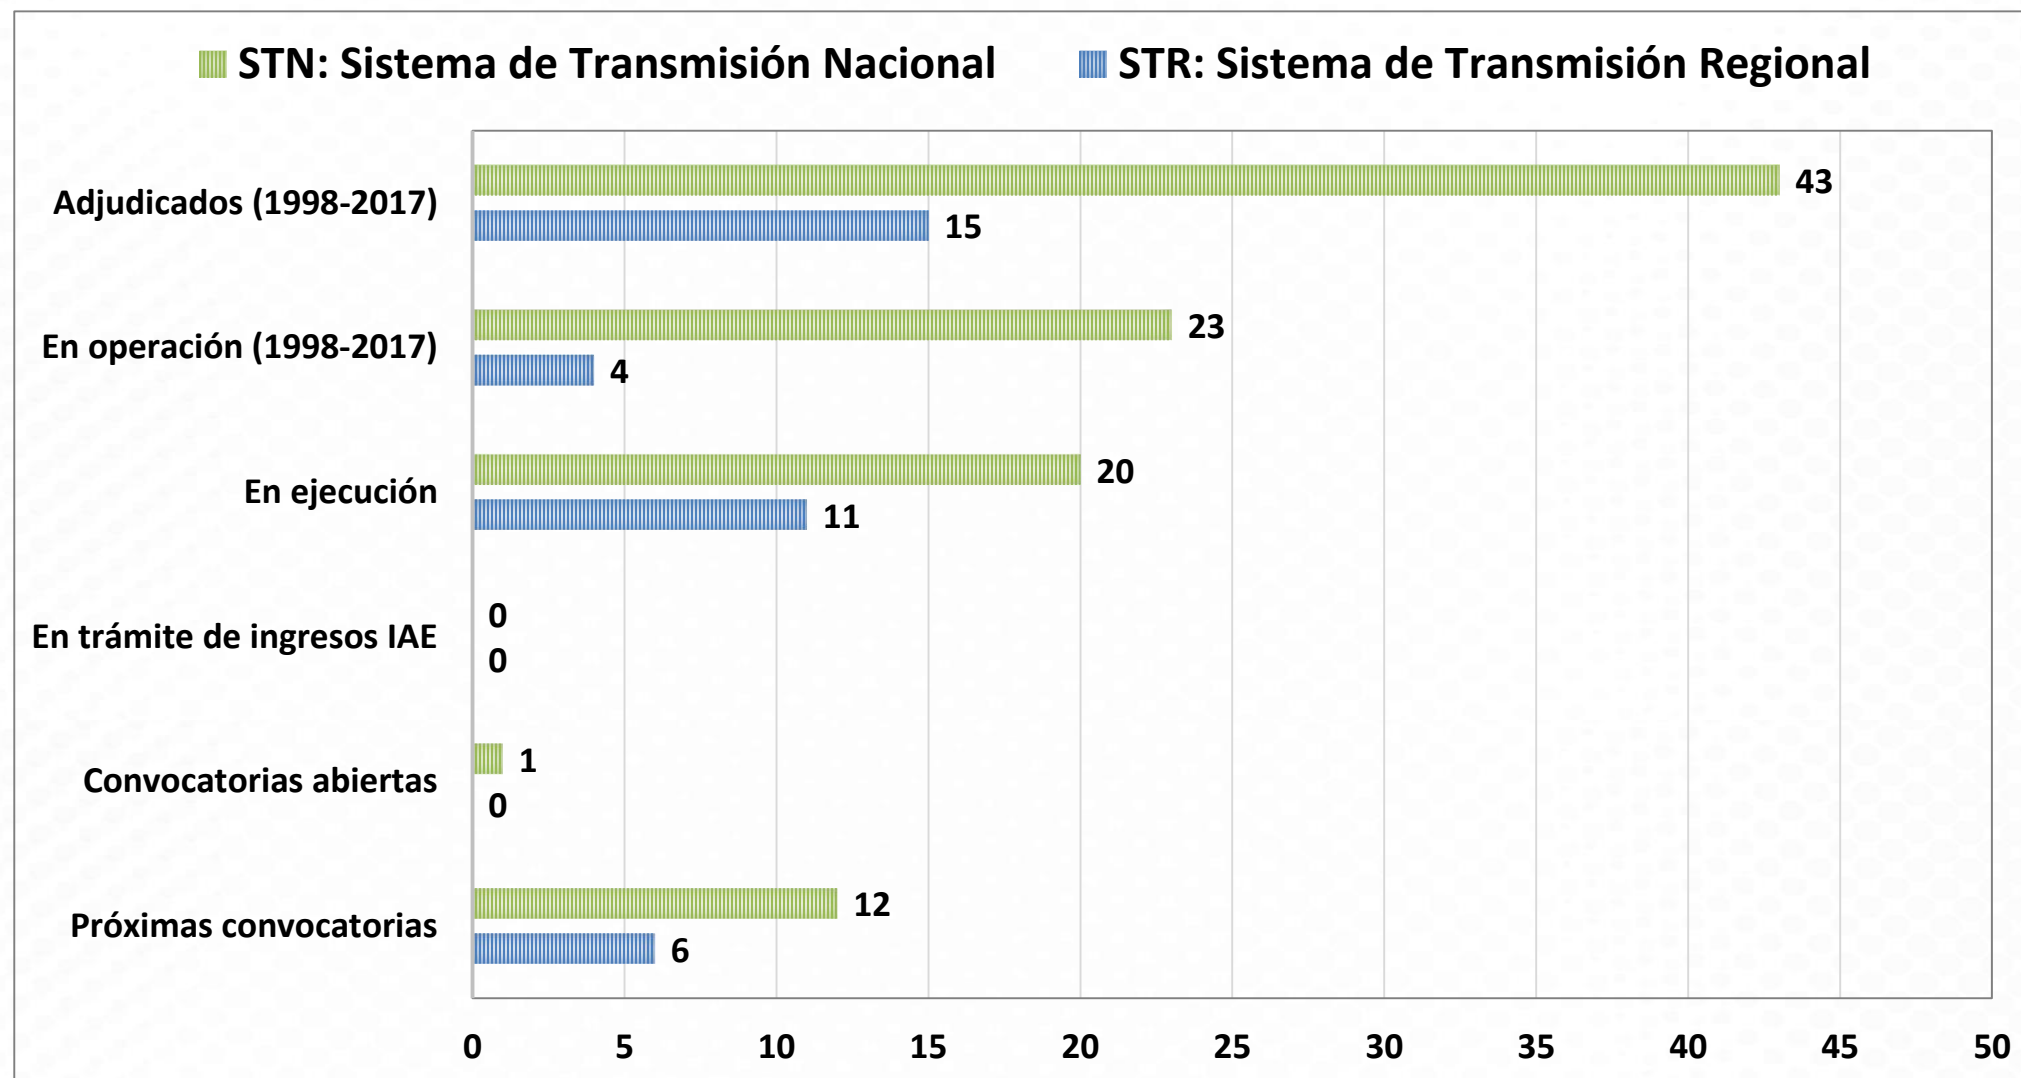

Proyectos STN en ejecución

		PROYECTO	UBICACIÓN	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
1	STN	Armenia 230 kV	Quindío y Risaralda	feb-18 (*)	●	En construcción. Una torre por terminar. Una torre colapsada: por desmontar y volver a montar. Torre 4: Construida, pendiente decisión Consejo Estado para cablear.
2	STN	Quimbo - Alférez 230 kV	Huila, Tolima y Valle	nov-18 (*)	●	Tramo 1: torres al 86%. Tramo 3: 30% en montaje. Tramo 2. Avanza desminado. Excavaciones 2A en 13% y 2B en 4%. 98 km, 10 meses de construcción luego de desminado.
3	STN	Chivor-Norte-Bacatá 230 kV	Boyacá y Cundinamarca	nov-19 (*)	●	Suspendido EIA. Pendiente sustracción y veda (Alerta). Se han realizado mesas de trabajo y presentado información complementaria. Alerta por mantenimiento en Central Chivor.
4	STN	Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV	Santander, Cundinamarca	nov-19 (*)	●	Suspendido EIA. Pendiente sustracción y veda (Alerta). Se han realizado mesas de trabajo y presentado información complementaria. Alerta por mantenimiento en Central Chivor
5	STN	Bolívar – Cartagena 220 kV	Bolívar	mar-18	●	Subterráneo por finalizar. Avanza el tramo aéreo. Avanzan obras en S/Es.
6	STN	Chinú – Montería – Urabá 230 kV	Córdoba, Antioquia	feb-17 sep-18	●	Chinú-Montería: Sin pendientes. Avanza construcción. PMA. Montería-Urabá: Pendiente modificación a licencia y trámites ICANH. Avanza lentamente construcción. Subestación: Recién inició construcción. ITCO mantiene la fecha de sep/2018, sin posibilidad de entrega temprana para conectar STR.
7	STN	Flores – Caracolí (Soledad) – Sabanalarga 220 kV	Atlántico	dic-17	●	Entró en servicio la S/E y la reconfiguración (sin efecto eléctrico). Próximo a finalizar construcción Flores-Caracolí-Sabanalarga. Dificultades en la gestión predial de sitios puntuales.
8	STN	Río Córdoba 230 kV	Magdalena	dic-17	●	El 13/dic/17 entra en operación junto con el STR. Se desconoce el estado de la conexión de Puerto Drummond.
9	STN	Suria 230 kV	Meta	nov-18 (*)	●	En evaluación el EIA, se realizó visita. DELSUR solicitó ajuste al trazado por existencia de urbanizaciones, pendiente respuesta.

Proyectos STN en ejecución

		PROYECTO	UBICACIÓN	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
10	STN	Conexión Ituango 500 kV	Antioquia y Córdoba	ago-18 dic-18 oct/19	●	Líneas a Cerro y Medellín con licencia, iniciando construcción. Línea a Porce II recientemente obtuvo licencia. Línea a Sogamoso sin licencia. Pendiente permiso CAS. Volvieron a radicar trámite en ICANH.
11	STN	Refuerzo Costa 500 kV	Córdoba, Sucre, Cesar	dic-19	●	Tramo 3 finalizadas Consultas Previas. Tramos 1 y 2 avanza consulta previa. De esto depende radicar el EIA. Chinú: ANLA pidió modificación pero había pedido cambio menor. ITCO presentó recurso de reposición.
12	STN	Refuerzo Suroccidente 500 kV	Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle	dic-19	●	El 12/oct/2017 se radicó EIA de Medellín-Virginia. Otros 2 EIA's en elaboración.
13	STN	La Loma 500 kV	Cesar	oct-18 (*)	●	Licencia en firme. Pendiente utilidad pública. Se revisó la distribución de los campos en la S/E.
14	STN	Palenque 230 kV	Santander	jun-19 (*)	●	MME declaró utilidad pública para lote de la subestación. Atrasos en la elaboración y radicación del EIA.
15	STN	Sochagota – San Antonio 230 kV	Boyacá	nov-18 (*)	●	EIA en evaluación. ITCO solicitó utilidad pública para la S/E. (3 subestaciones en 700 m)
16	STN	Conexión La Enea 230 kV	Caldas	nov-17	●	El 30/nov/2017 entró en operación.
17	STN	La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV	Risaralda, Caldas, Tolima, C/marca	nov-21	●	DAA en evaluación. Pendiente respuesta ANLA. Dificultades en los contratos de conexión.
18	STN	La Sierra Bahía de transformación 220 kV	Antioquia	dic-17	●	Finalizando montaje. Sin novedad.
19	STN	Copecy – Cuestecitas, Copecy - Fundación	Cesar, La Guajira	Nov-20	●	Iniciando ejecución. En diseños
20	STN	Bahía tercer transformador El Bosque	Bolívar	nov-18	●	Iniciando ejecución
21	STN	Bahía tercer transformador Valledupar	Cesar	Mar-18	●	Iniciando ejecución

Proyectos STR en ejecución

		PROYECTO	UBICACIÓN	FPO prevista	ALERTA	ESTADO
1	STR	Río Córdoba 220/110 kV	Magdalena	dic-17	●	Finalizado. Entra en servicio el 13/dic/2017 La utilidad y puesta en servicio depende del STN.
2	STR	Nueva Montería 230/110 kV	Córdoba	nov-17	●	Energizado. La utilidad y puesta en servicio depende del STN.
3	STR	Manzanillo, Bolívar, Bayunca (Bolívar 2) 110 kV	Bolívar	jun-18	●	Le otorgaron licencia ambiental. Iniciaron obras en Bolívar. Amparo policivo para Manzanillo. Se revisará el cronograma y la FPO.
4	STR	Norte, Nueva B/quilla 110 kV	Atlántico	nov-18	●	EIA en evaluación luego de definirse autoridad ambiental. Se cuenta con levantamiento de veda. Por finalizar revisión de diseños de la S/E. No se han firmado contratos de conexión.
5	STR	Cereté 110 kV	Córdoba	jun-18	●	Pendiente licencia ambiental, se realizó audiencia el 13/sep/17. Se otorgó veda. Atraso. Dificultades con información para el interventor.
6	STR	La Loma 500/110 kV	Cesar	dic-18	●	Pendiente utilidad pública. EIA en elaboración. Se esperan protocolización de consultas previas en nov/2017
7	STR	Caracolí STR 110 kV	Atlántico	jun-18	●	Tramo 1: licencia aprobada. Inició construcción S/E. Tramo 2: EIA en evaluación luego que se definiera autoridad (CRA).
8	STR	Anillo La Guajira (Cuestecitas-Riohacha-Maicao 110 kV	La Guajira	dic-19	●	EIA en elaboración. En diseños. Gran avance en consultas previas, incluso con las comunidades adicionales que se certificaron.
9	STR	Tercer transformador 220/66 kV El Bosque	Bolívar	Dic/18	●	Iniciando ejecución
10	STR	Tercer transformador 220/34,5 kV Valledupar	Cesar	Mar/19	●	Iniciando ejecución
11	STR	Segundo transformador 230/115 kV Altamira	Huila	Mar-19	●	Iniciando ejecución

GRACIAS

www.upme.gov.co



@upmeoficial



Upme (Oficial)
